

Relatório de Desempenho do Projeto NoPod:

Sprint 4

Arthur Mendes de Vasconcelos

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
15/05/2026	1.0	Criação do Relatório de Desempenho da Sprint 4	Arthur Mendes de Vasconcelos

1 Resumo Executivo da Sprint 4

Período da Sprint: 01/05/2026 a 15/05/2026.

Objetivo da Sprint: Desenvolver a tela inicial do aplicativo NoPod, integrar os dados do usuário ao Firebase Firestore e implementar a exibição das principais informações do progresso diário.

Status Geral: Dentro do prazo.

Durante esta sprint, a equipe concentrou seus esforços na implementação da tela principal do aplicativo NoPod, também chamada de Dashboard. Essa tela tem como objetivo apresentar ao usuário seu progresso diário, exibindo informações como nome/apelido, contador de vezes que deixou de fumar no dia e data da última resistência registrada.

Além disso, foram realizadas integrações com o Firebase Firestore para permitir o armazenamento e a recuperação dos dados do usuário de forma mais organizada e segura.

2 Indicadores de Produtividade

2.1 Métricas de Tempo

Response Time: 0,8 dias.

Tempo médio entre a entrada da tarefa no backlog da sprint e o início efetivo do desenvolvimento.

Cycle Time: 2,5 dias.

Tempo médio em que cada tarefa permaneceu em desenvolvimento ativo, desde o início da execução até sua conclusão.

Lead Time: 3,3 dias.

Tempo médio total entre o planejamento da tarefa e sua entrega final.

2.2 Métrica de Volume

Throughput: 5 tarefas entregues na sprint.

As tarefas concluídas foram:

- Desenvolvimento da tela Dashboard;
- Integração com Firebase Firestore;
- Exibição do nome/apelido do usuário;
- Implementação do contador diário;
- Implementação da exibição da última resistência.

3 Análise de Rastreabilidade e Cruzamento de Dados

3.1 Planejado vs. Realizado

Tarefas planejadas no backlog: 5.

Tarefas concluídas: 5.

Justificativa de desvios:

Não houve desvios relevantes nesta sprint. Todas as tarefas planejadas foram concluídas dentro do período previsto. O principal ponto de atenção foi a integração com o Firebase Firestore, que exigiu mais tempo por envolver ajustes na estrutura dos documentos dos usuários e nas regras de acesso ao banco de dados.

3.2 Eficiência e Esforço

Total de horas trabalhadas pela equipe: 30 horas.

Número de entregas semanais realizadas: 2.

Relação Horas/Throughput:

$$\frac{30\text{horas}}{5\text{tarefas}} = 6\text{horasportarefa}$$

Em média, foram necessárias aproximadamente 6 horas de esforço da equipe para concluir cada tarefa planejada.

4 Análise Crítica e Plano de Ação

4.1 Gargalos Identificados

O principal gargalo identificado ocorreu durante a integração com o Firebase Firestore. Essa tarefa apresentou maior tempo de ciclo devido à necessidade de estruturar corretamente os dados do usuário e garantir que as informações fossem carregadas corretamente na Dashboard.

Também houve necessidade de ajustes nas regras de acesso do Firestore, permitindo que cada usuário autenticado pudesse acessar apenas seus próprios dados.

4.2 Gráfico de Cycle Time por Tarefa

A tarefa de integração com o Firebase apresentou o maior Cycle Time, com 4 dias, sendo considerada o principal ponto de atenção da sprint.

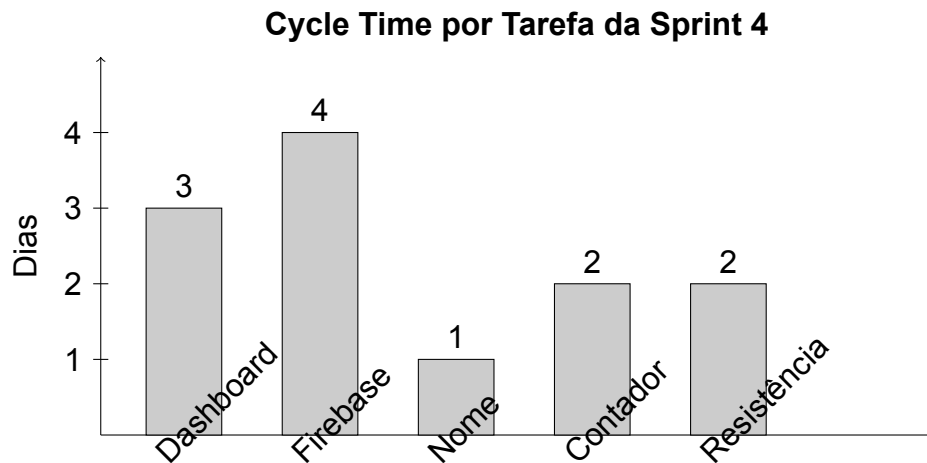


Figura 1: Comparação do tempo de ciclo das tarefas desenvolvidas na Sprint 4.

4.3 Estratégia de Mitigação

Como estratégia de mitigação, a equipe decidiu que nas próximas sprints as tarefas de integração serão divididas em etapas menores. Dessa forma, será possível testar cada parte da funcionalidade separadamente, reduzindo a chance de retrabalho.

Também foi definido que a modelagem dos dados deverá ser revisada antes do início do desenvolvimento, principalmente nas funcionalidades que dependem do Firebase.

4.4 Lições Aprendidas na Gestão do Fluxo

A Sprint 4 mostrou a importância de dividir funcionalidades maiores em tarefas menores e mais controláveis. Também ficou evidente que integrações com banco de dados devem ser planejadas com antecedência, especialmente quando envolvem dados de usuários autenticados.

A comunicação entre os membros da equipe e o acompanhamento constante das tarefas contribuíram para que a sprint fosse concluída dentro do prazo.

5 Conclusão

A Sprint 4 foi concluída com sucesso, atingindo todos os objetivos definidos no planejamento. A Dashboard foi implementada, os dados do usuário passaram a

ser integrados ao Firebase Firestore e as principais informações de progresso diário começaram a ser exibidas no aplicativo.

Essa sprint representou um avanço importante no desenvolvimento do NoPod, pois consolidou a tela principal do usuário e preparou a base para as próximas funcionalidades, como metas personalizadas, recompensas, histórico e estatísticas.
